# Gefahrenermittlung

Belastung durch Stäube

Arbeitsbereich: Trockenbau schleifen

Kontroll-Nr.: Muster 5

Ermittlung durch: Musterbau/Hr. Mustermann

Datum: XX.XX.20XX
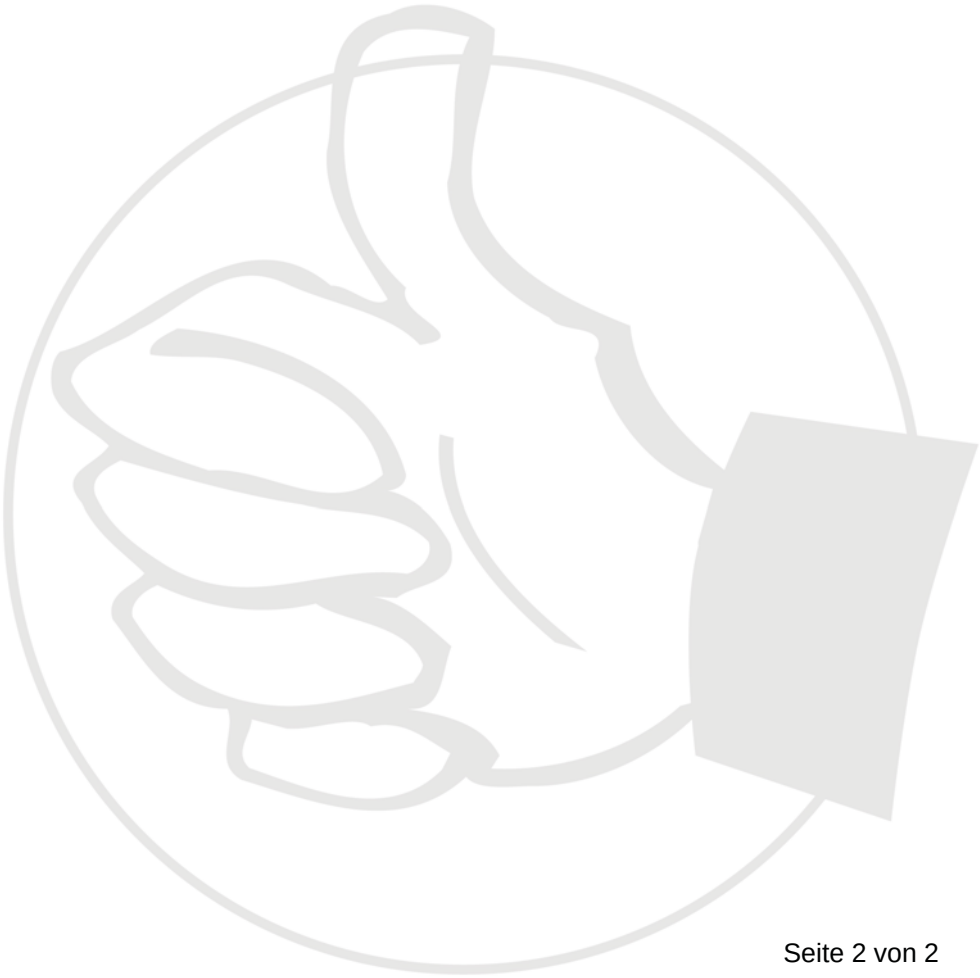
| allgemeine Punkte | ja | nein | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Grenzwerte werden eingehalten | ☒ | ☐ | Branchenlösung Mappe "Sicherheit am Bau" D 26.2, Nr. 18 |
| Spitzenbegrenzungen werden eingehalten | ☒ | ☐ | |
| Stoffwahl bedingt geringe (keine) Staubbelastung | ☐ | ☒ | |
| Bearbeitungstechnik mit geringer Staubbelastung | ☒ | ☐ | abgesaugter Exzenter-/ Schwingschleifer/ Schleifgiraffe |
| wenn möglich geschlossener Prozeß | ☐ | ☒ | |
| betriebstechnische Maßnahmen optimiert | ☒ | ☐ | |
| direkte Erfassung an der Entstehungsstelle | ☒ | ☐ | |
| optimal gewählte Raumlufttechnik | ☒ | ☐ | Luftreiniger |
| Sauberkeit, Hygiene zufriedenstellend | ☒ | ☐ | |
| notwendige PSA wird konsequent verwendet | ☒ | ☐ | |
| regelmäßige Staubentfernung | ☒ | ☐ | |
| _____ | ☐ | ☐ | |
| | | | |
| **Staubschutzeinrichtungen** | **ja** | **nein** | **Anmerkungen** |
| konsequente Verwendung | ☒ | ☐ | |
| richtige Verwendung | ☒ | ☐ | |
| regelmäßige Überprüfungen finden statt | ☒ | ☐ | |
| Erfassungselemente an der Emissionsquelle | ☒ | ☐ | |
| Saugleitungen sind dicht | ☒ | ☐ | |
| Filter und Abscheider geeignet | ☒ | ☐ | |
| regelmäßiger Filtertausch bzw. -reinigung | ☒ | ☐ | |
| _____ | ☐ | ☐ | |
